

# REPORTE PERIÓDICO

Mes de Junio

A photograph showing several construction workers in safety gear (hard hats, high-visibility vests) working on a sidewalk. They are using tools to lay paving stones. The scene is outdoors, with trees and a fence in the background. A white arrow points to the right on the right side of the image.

# Acuerdo


# Capital

***Avenidas Aristóbulo del Valle,  
J. J. Paso, de los Siete Jefes, Peñaloza  
y calle Larrea***





***Etapas  
inicial***

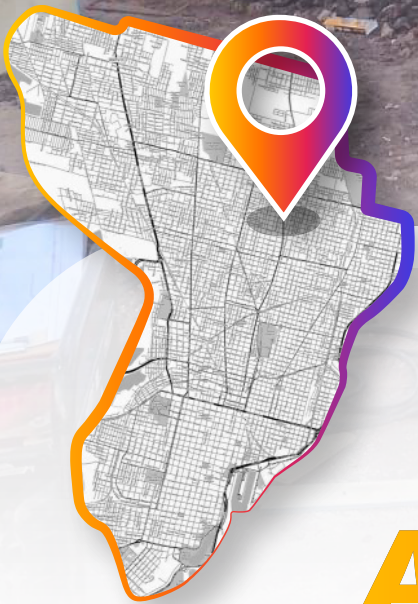

## ***Cantero central de Av. Aristóbulo del Valle***

Estamos llevando a cabo trabajos de aserrado, rotura y remoción de pavimento asfáltico, demolición parcial de cordones existentes, excavación para tendido de instalación eléctrica y ejecución de cordones de hormigón armado; posicionamiento de armaduras y encofrados.

A la par, realizamos trabajos de desagües pluviales para favorecer el drenaje a partir de sistemas de captaciones y conducciones del agua.



**30%**  
**de avance**  
**de obra**



## **Cantero central de** **Av. Juan José Paso**


Avanzamos los con trabajos de colocación de losetas, bordillos y replanteo de bicisendas.

En la esquina de Saavedra, se ejecuta el pavimento articulado y completan los cabezales del cantero, mientras que en Urquiza se realiza la rotura del pavimento y el retiro de escombros.

Además, estamos restaurando las columnas de iluminación con tareas de lijado y pintura.



***Etapas  
inicial***

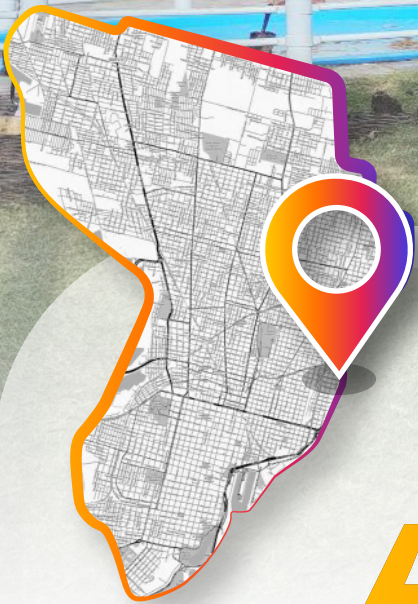

## ***Cantero central de Av. de los Siete Jefes***

Completamos el armado del cerco perimetral con puntales, malla sima y media sombra negra. También finalizamos el montaje del obrador e iniciamos el retiro de mobiliario urbano en las zonas a destinadas a intervenir.

Ya se realiza la detección de infraestructuras de servicios que atraviesan la traza de intervención para garantizar los trabajos con maquinaria pesada.



**18%**  
**de avance**  
**de obra**



## *Pavimentación de* **Av. Peñaloza**

Realizamos el desmonte de la bicisenda y los cordones existentes. Luego, avanzamos con la ejecución de bases, la construcción de nuevos cordones y el pavimento de hormigón a la vez que procedemos en la construcción de solados peatonales.

Como obras complementarias, estamos instalando desagües pluviales con caños de hormigón armado y bocas de tormenta, y realizando cruces de servicios para el nuevo alumbrado público.



**76,5%**  
**de avance**  
**de obra**



## ***Pavimentación de*** ***Calle Larrea***

Hemos completado la remoción del cordón cuneta, el movimiento de suelo y la preparación de subrasante en más de 11.000 m<sup>2</sup>. También aplicamos bases de relleno, granular cementada, riego asfáltico y colocamos pavimento en caliente.

También instalamos un nuevo sistema de nuevo cordón cuneta, ejecutaron vigas de borde y regularizaron veredas y desagües pluviales domiciliarios.
